ОБЩИНА ГАБРОВО

П Р О Т О К О Л

На 09.10.2026 г. от 14:00 часа, в сградата на Община Габрово, се проведе заседание на комисията за провеждане на обществена поръчка – събиране на оферти с обява по реда на ЗОП с предмет: **Основен ремонт на административна сграда в с. Музга в УПИ I-за административни и обслужващи дейности в кв. 14 по плана на с. Музга, Община Габрово: I етап Основен ремонт на покрив,** открита с Обява № F906372/ 28.09.2026 г. на Възложителя.

Комисията е назначена със Заповед № 2202/ 09.10.2026 г. на Възложителя, в състав:
Председател: Емилия Драганешева – директор дирекция ИЕ, Община Габрово;

Членове:
1. инж. Стилияна Иванова – н-к отдел ТИСС, Община Габрово;
2. инж. Момчил Корназов – гл. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово;
3. инж. Богдан Бонев – ст. експерт отдел ТИСС, Община Габрово
4. Цветина Козарева – ст. експерт отдел ОПК, Община Габрово;

Резервни членове:
1. инж. Янка Здравкова – н-к отдел ОПК, Община Габрово;
2. Венета Ганева – гл. експерт отдел ОПК, Община Габрово;
3. инж. Малина Дончева – гл. експерт отдел ТИСС.

Комисията има задача да извърши подбор, разгледа, оцени и класира получените оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **Основен ремонт на административна сграда в с. Музга в УПИ I-за административни и обслужващи дейности в кв. 14 по плана на с. Музга, Община Габрово: I етап Основен ремонт на покрив.**

I. До крайния срок за получаване на оферти (23:59 ч. на 08.10.2026 г.), чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“/ЦАИС – ЕОП/ са подадени 8 оферти, както следва:

№	Участник	Вх. №, дата и час
1.	БЕТОНСТРОЙ 7 ЕООД	OF2952051 от 30 сеп 2026 (сря), 17:54:56
2.	ИВ БИЛД БГ ЕООД	OF2961220 от 07 окт 2026 (сря), 19:35:00
3.	ТОНИ ГРУП 76 ЕООД	OF2961241 от 07 окт 2026 (сря), 19:38:05
4.	СТРОЙ ДОМ 79 БГ ЕООД	OF2961293 от 07 окт 2026 (сря), 19:42:05
5.	КАПИТОЛ-К ЕООД	OF2959584 от 08 окт 2026 (чет), 13:07:56
6.	ЕТ ПРОЕКТСТРОЙ-ПЕТЪР ПЕТРОВ-ПЕТЯ ПЪТЕВА	OF2959762 от 08 окт 2026 (чет), 14:46:09
7.	КОЛЕВ ГРУП СТРОЙ 2001 ЕООД	OF2962985 от 08 окт 2026 (чет), 17:15:36
8.	ВЕРА СТРОЙ ПРОЕКТ ЕООД	OF2957537 от 08 окт 2026 (чет), 23:19:16

ОБЩИНА ГАБРОВО

Председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията установи:

- участници **ИВ БИЛД БГ ЕООД, ТОНИ ГРУП 76 ЕООД, СТРОЙ ДОМ 79 БГ ЕООД, КАПИТОЛ-К ЕООД, ЕТ ПРОЕКТСТРОЙ-ПЕТЪР ПЕТРОВ-ПЕТЯ ПЪТЕВА, КОЛЕВ ГРУП СТРОЙ 2001 ЕООД и ВЕРА СТРОЙ ПРОЕКТ ЕООД** са декриптирали своите оферти и съдържанието им е достъпно за членовете на комисията;
- участник **БЕТОНСТРОЙ 7 ЕООД** не е декриптирал своята оферта.

Комисията установи, че Системата е изпратила автоматично известие на участниците в процедурата за декриптиране на ключовете на 09 окт 2026 (пет), 0:15:13, в т. ч. и до представителя на **БЕТОНСТРОЙ 7 ЕООД**, определен като лице за контакт, с посочен краен срок за това, а именно: 09 октомври 2026 (петък) 14:00 (UTC+3).

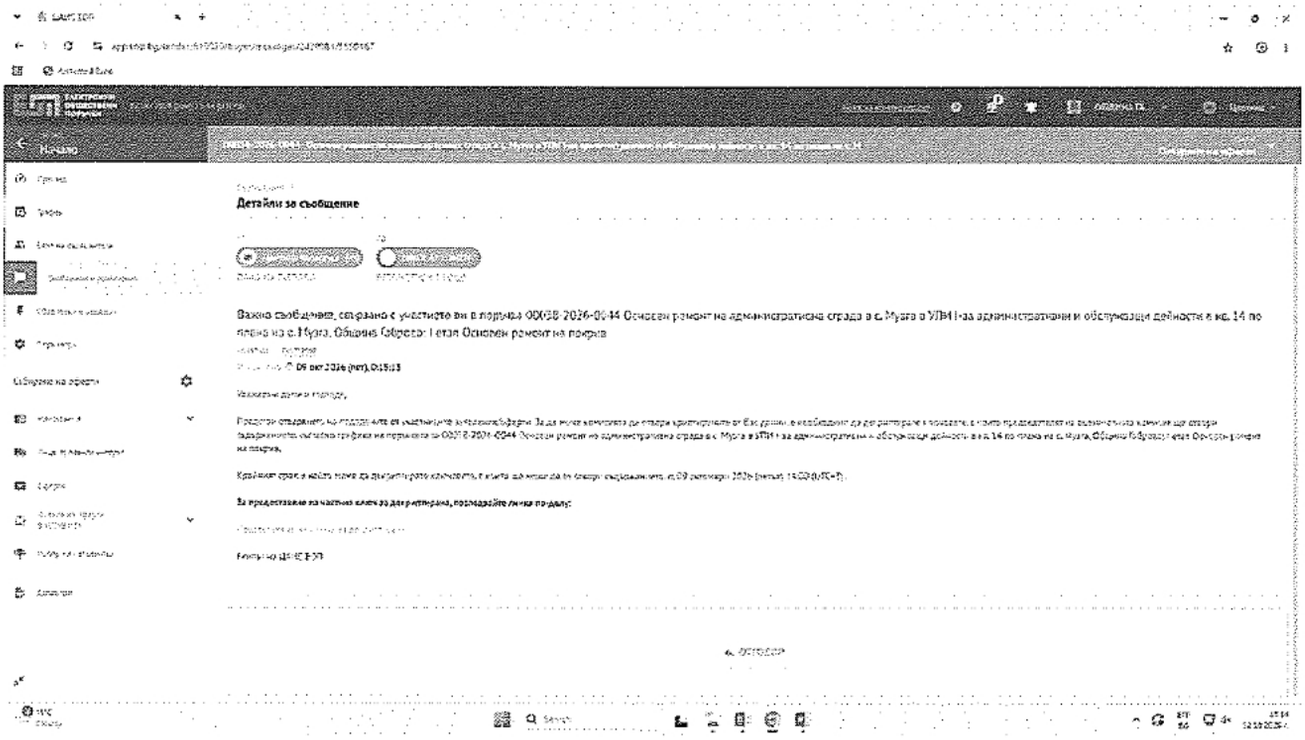

Съгласно чл. 9л, ал. 5 от ППЗОП, участници, които не са декриптирали офертите си до срока, определен за отваряне в графика на поръчката, се отстраняват от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

Предвид гореизложеното, комисията предлага на Възложителя участник БЕТОНСТРОЙ 7 ЕООД да се отстрани от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 9л, ал. 5 от ППЗОП.

Офертите се разглеждат по реда на чл. 187, ал. 2 от ЗОП, и чл. 97, ал. 7, във връзка с чл. 61, ал. 2-4 от ППЗОП.

ОБЩИНА ГАБРОВО

Председателят на комисията декриптира офертите и отвори ценовите предложения заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП.

Комисията констатира, че по показателя, подлежащ на оценяване, участниците са направили следните предложения:

№	*Участник*	*Обща цена*
1.	**ИВ БИЛД БГ ЕООД**	**77 930,44 евро без ДДС**
2.	**ТОНИ ГРУП 76 ЕООД**	**59 691,44 евро без ДДС**
3.	**СТРОЙ ДОМ 79 БГ ЕООД**	**60 775,41 евро без ДДС**
4.	**КАПИТОЛ-К ЕООД**	**83 037,09 евро без ДДС**
5.	**ЕТ ПРОЕКТСТРОЙ-ПЕТЪР ПЕТРОВ-ПЕТЯ ПЪТЕВА**	**78 272,92 евро без ДДС**
6.	**КОЛЕВ ГРУП СТРОЙ 2001 ЕООД**	**69 389,19 евро без ДДС**
7.	**ВЕРА СТРОЙ ПРОЕКТ ЕООД**	**77 700,00 евро без ДДС**

II. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 3, т. 1. и т. 2 от ППЗОП за съответствие със ЗОП, ППЗОП и условията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка по реда на подаване на офертите.

А/ Проверка на съдържанието на техническите предложения за съответствие с изискванията на Възложителя.

1. ИВ БИЛД БГ ЕООД

Участникът е представил Техническо предложение, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец 1.

Приложени са линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

- Участникът декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;

- Информация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – участникът е посочил, като неприложимо в предложението да се съдържа информация, която да е конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна.

Комисията извърши преглед на представеното Техническо предложение и приложенията към него, при което констатира:

Съгласно представения *Образец 1*, участникът е посочил следното:

I. Срок за изпълнение на СМР, предмет на поръчката 50 (петдесет) календарни дни.

II. Гаранционни срокове за изпълнените строително - монтажните работи - не по-кратки от посочените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

ОБЩИНА ГАБРОВО

При извършения детайлен преглед на представеното техническо предложение са констатирани следните несъответствия с предварително обявените изисквания на Възложителя:

1. В приложения линеен график, участникът **не е предвидил неблагоприятни за работа дни.** От предложението на участника не е видно, нито колко дни, нито кога е предвидил дни за неблагоприятни атмосферни условия. Участникът е предвидил извършване на дейности във всеки от предвидените дни за изпълнение, т.е. липсват предвидени дни неблагоприятни за работа, които да отговарят на предназначението си, а именно резерв от време, в който поради неблагоприятни атмосферни условия и невъзможност за работа не се предвижда изпълнение на СМР.

С това не е спазено изискването на Възложителя по отношение на линейния график, посочено в документацията – *Образец 1 Предложение за изпълнение/ - II. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ*, а именно: ***„В него е необходимо да се предвидят и дни за неблагоприятни атмосферни условия.“***

2. Констатирано е разминаване между диаграмата на механизацията и линейния график за товарния автомобил и малка механизация, а именно:

- Спрямо диаграмата на механизацията товарен автомобил е предвиден от 1 до 50 ден (общо 50 дни), докато в линейния график товарен автомобил е предвиден да бъде ползван само 2 дни.

- Спрямо диаграмата на механизацията малката механизация е предвидена да бъде използвана от 2 до 49 ден, докато в линейния график в колона механизация малка механизация въобще не фигурира.

Въз основа на направените заключения, Комисията констатира:

Офертата на участника не съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и на изискванията на Възложителя, обективирани в документацията за участие и не се допуска до разглеждане на ценовото предложение.

Предвид гореизложеното, комисията предлага на Възложителя участник ИВ БИЛД БГ ЕООД да се отстрани от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ и т. 5, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, тъй като представената оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на обществената поръчка и на условията за представяне, посочени в документацията - предложение за изпълнение образец №1.

2. ТОНИ ГРУП 76 ЕООД

Участникът е представил Техническо предложение, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец 1.

Приложени са линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

- Участникът декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;

- Информация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – участникът е посочил, като неприложимо в предложението да се съдържа информация, която да е конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна.

ОБЩИНА ГАБРОВО

Комисията извърши преглед на представеното Техническо предложение и приложенията към него, при което констатира:

Съгласно представения *Образец 1*, участникът е посочил следното:

I. Срок за изпълнение на СМР, предмет на поръчката 49 (четиридесет и девет) календарни дни.

II. Гаранционни срокове за изпълнените строително - монтажните работи - не по-кратки от посочените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

При извършения детайлен преглед на представеното техническо предложение е констатирано следното несъответствие с предварително обявените изисквания на Възложителя:

В приложения линеен график, участникът **не е предвидил неблагоприятни за работа дни.** От предложението на участника не е видно, нито колко дни, нито кога е предвидил дни за неблагоприятни атмосферни условия. Участникът е предвидил извършване на дейности във всеки от предвидените дни за изпълнение, т.е. липсват предвидени дни неблагоприятни за работа, които да отговарят на предназначението си, а именно резерв от време, в който поради неблагоприятни атмосферни условия и невъзможност за работа не се предвижда изпълнение на СМР.

С това не е спазено изискването на Възложителя по отношение на линейния график, посочено в документацията – *Образец 1 Предложение за изпълнение/ - II. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ*, а именно: ***„В него е необходимо да се предвидят и дни за неблагоприятни атмосферни условия.“***

Въз основа на направените заключения, Комисията констатира:

Офертата на участника не съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и на изискванията на Възложителя, обективирани в документацията за участие и не се допуска до разглеждане на ценовото предложение.

Предвид гореизложеното, комисията предлага на Възложителя участник ТОНИ ГРУП 76 ЕООД да се отстрани от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ и т. 5, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, тъй като представената оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на обществената поръчка и на условията за представяне, посочени в документацията - предложение за изпълнение образец №1.

3. СТРОЙ ДОМ 79 БГ ЕООД

Участникът е представил Техническо предложение, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец 1.

Приложени са линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

- Участникът декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;

- Информация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – участникът е посочил: „НЯМА наличие на конфиденциална информация в нашето предложение“.

ОБЩИНА ГАБРОВО

Комисията извърши преглед на представеното Техническо предложение и приложенията към него, при което констатира:

Съгласно представения *Образец 1*, участникът е посочил следното:

I. Срок за изпълнение на СМР, предмет на поръчката 48 (четиридесет и осем) календарни дни.

II. Гаранционни срокове за изпълнените строително - монтажните работи - не по-кратки от посочените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

При извършения детайлен преглед на представеното техническо предложение са констатирани следните несъответствия с предварително обявените изисквания на Възложителя:

1. В приложения линеен график, участникът **не е предвидил неблагоприятни за работа дни.** От предложението на участника не е видно, нито колко дни, нито кога е предвидил дни за неблагоприятни атмосферни условия. Участникът е предвидил извършване на дейности във всеки от предвидените дни за изпълнение, т.е. липсват предвидени дни неблагоприятни за работа, които да отговарят на предназначението си, а именно резерв от време, в който поради неблагоприятни атмосферни условия и невъзможност за работа не се предвижда изпълнение на СМР.

С това не е спазено изискването на Възложителя по отношение на линейния график, посочено в документацията – *Образец 1 Предложение за изпълнение/ - II. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ*, а именно: ***„В него е необходимо да се предвидят и дни за неблагоприятни атмосферни условия.“***

2. Констатирано е разминаване между диаграмата на механизацията и линейния график за товарния автомобил и ръчните инструменти, а именно:

- Спрямо диаграмата на механизацията товарен автомобил е предвиден от 1 до 48 ден (общо 48 дни), докато в линейния график товарен автомобил е предвиден да бъде ползван само 2 дни.

- Спрямо диаграмата на механизацията ръчни инструменти са предвидени да бъдат използвани от 2 до 47 ден, докато в линейния график в колона механизация ръчни инструменти въобще не фигурират.

Въз основа на направените експертни заключения, Комисията констатира:

Офертата на участника не съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и на изискванията на Възложителя, обективирани в документацията за участие и не се допуска до разглеждане на ценовото предложение.

Предвид гореизложеното, комисията предлага на Възложителя участник СТРОЙ ДОМ 79 БГ ЕООД да се отстрани от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ и т. 5, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, тъй като представената оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на обществената поръчка и на условията за представяне, посочени в документацията - предложение за изпълнение образец №1.

ОБЩИНА ГАБРОВО

4. КАПИТОЛ-К ЕООД

Участникът е представил Техническо предложение, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец 1.

Приложени са линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

- Участникът декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;

- Информация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – участникът е посочил: „В предложението не се съдържа информация, която смятаме за конфиденциална съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП".

Комисията извърши преглед на представеното Техническо предложение и приложенията към него, при което констатира:

Съгласно представения *Образец 1*, участникът е посочил следното:

I. Срок за изпълнение на СМР, предмет на поръчката 50 (петдесет) календарни дни.

II. Гаранционни срокове за изпълнените строително - монтажните работи - не по-кратки от посочените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

При извършения детайлен преглед на представеното техническо предложение не се констатираха несъответствия с предварително обявените изисквания на Възложителя.

Въз основа на направените заключения, Комисията прие за установено, че Техническото предложение на участника съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и на изискванията на Възложителя, обективирани в документацията за участие и офертата на участника се допуска до разглеждане на ценовото предложение.

5. ЕТ ПРОЕКТСТРОЙ-ПЕТЪР ПЕТРОВ-ПЕТЯ ПЪТЕВА

Участникът е представил Техническо предложение, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец 1.

Приложени са линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

- Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д" от ППЗОП;

- Информация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – участникът е посочил: „Не се съдържа конфиденциална информация."

Комисията извърши преглед на представеното Техническо предложение и приложенията към него, при което констатира:

Съгласно представения *Образец 1*, участникът е посочил следното:

I. Срок за изпълнение на СМР, предмет на поръчката 50 (петдесет) календарни дни.

II. Гаранционни срокове за изпълнените строително - монтажните работи - не по-кратки от посочените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

ОБЩИНА ГАБРОВО

При извършения детайлен преглед на представеното техническо предложение е констатирано следното несъответствие с предварително обявените изисквания на Възложителя:

В приложения линеен график, участникът **не е предвидил неблагоприятни за работа дни.** От предложението на участника не е видно, нито колко дни, нито кога е предвидил дни за неблагоприятни атмосферни условия. Участникът е предвидил извършване на дейности във всеки от предвидените дни за изпълнение, т.е. липсват предвидени дни неблагоприятни за работа, които да отговарят на предназначението си, а именно резерв от време, в който поради неблагоприятни атмосферни условия и невъзможност за работа не се предвижда изпълнение на СМР.

С това не е спазено изискването на Възложителя по отношение на линейния график, посочено в документацията – *Образец 1 Предложение за изпълнение/ - II. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ*, а именно: ***„В него е необходимо да се предвидят и дни за неблагоприятни атмосферни условия.“***

Въз основа на направените експертни заключения, Комисията констатира:

Офертата на участника не съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и на изискванията на Възложителя, обективирани в документацията за участие и не се допуска до разглеждане на ценовото предложение.

Предвид гореизложеното, комисията предлага на Възложителя участник ЕТ ПРОЕКТСТРОЙ-ПЕТЪР ПЕТРОВ-ПЕТЯ ПЪТЕВА да се отстрани от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ и т. 5, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, тъй като представената оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на обществената поръчка и на условията за представяне, посочени в документацията - предложение за изпълнение образец №1.

6. КОЛЕВ ГРУП СТРОЙ 2001 ЕООД

Участникът е представил Техническо предложение, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец 1.

Приложени са линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

- Участникът декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;

- Информация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – участникът е посочил, че в предложението не се съдържа информация, която да е конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна.

Комисията извърши преглед на представеното Техническо предложение и приложенията към него, при което констатира:

Съгласно представения *Образец 1*, участникът е посочил следното:

I. Срок за изпълнение на СМР, предмет на поръчката 50 (петдесет) календарни дни.

II. Гаранционни срокове за изпълнените строително - монтажните работи - не по-кратки от посочените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

ОБЩИНА ГАБРОВО

При извършения детайлен преглед на представеното техническо предложение е констатирано следното несъответствие с предварително обявените изисквания на Възложителя:

В приложения линеен график, участникът **не е предвидил неблагоприятни за работа дни.** От предложението на участника не е видно, нито колко дни, нито кога е предвидил дни за неблагоприятни атмосферни условия. Участникът е предвидил извършване на дейности във всеки от предвидените дни за изпълнение, т.е. липсват предвидени дни неблагоприятни за работа, които да отговарят на предназначението си, а именно резерв от време, в който поради неблагоприятни атмосферни условия и невъзможност за работа не се предвижда изпълнение на СМР.

С това не е спазено изискването на Възложителя по отношение на линейния график, посочено в документацията – *Образец 1 Предложение за изпълнение/ - II. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ*, а именно: ***„В него е необходимо да се предвидят и дни за неблагоприятни атмосферни условия.“***

Въз основа на направените експертни заключения, Комисията констатира:

Офертата на участника не съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и на изискванията на Възложителя, обективирани в документацията за участие и не се допуска до разглеждане на ценовото предложение.

Предвид гореизложеното, комисията предлага на Възложителя участник КОЛЕВ ГРУП СТРОЙ 2001 ЕООД да се отстрани от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ и т. 5, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, тъй като представената оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на обществената поръчка и на условията за представяне, посочени в документацията - предложение за изпълнение образец №1.

7. ВЕРА СТРОЙ ПРОЕКТ ЕООД

Участникът е представил Техническо предложение, съдържащо:

- *Предложение за изпълнение на поръчката – Образец 1.*

Приложени са линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

- *Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП;*

- *Информация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП* – участникът е посочил, че в предложението не се съдържа информация, която да е конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна.

Комисията извърши преглед на представеното Техническо предложение и приложенията към него, при което констатира:

Съгласно представения *Образец 1*, участникът е посочил следното:

I. Срок за изпълнение на СМР, предмет на поръчката 50 (петдесет) календарни дни.

II. Гаранционни срокове за изпълнените строително - монтажните работи - не по-кратки от посочените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

ОБЩИНА ГАБРОВО

При извършения детайлен преглед на представеното техническо предложение са констатирани следните несъответствия с предварително обявените изисквания на Възложителя:

1. В линейния график е посочено, че дните за неблагоприятни условия са предвидени от 45 до 50 ден, общо 6 дни, същевременно за 45 ден е посочено, че ще се извършва изпитване на заземителната инсталация и измервания и съответно има предвидена механизация (уред за измерване съпротивлението на заземителя) и хора които ще работят.

2. В диаграмата на механизацията фигурира механизация до 47 ден, съблюдавайки факта, че обекта приключва с предвидени дни за неблагоприятни условия след 44 ден не трябва да фигурира каквато и да е механизация.

Участникът е предвидил извършване на дейности в дни, в които поради неблагоприятни атмосферни условия и невъзможност за работа не се предвижда изпълнение на СМР.

Офертата на участника не съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и на изискванията на Възложителя, обективирани в документацията за участие и не се допуска до разглеждане на ценовото предложение.

Предвид гореизложеното, комисията предлага на Възложителя участник ВЕРА СТРОЙ ПРОЕКТ ЕООД да се отстрани от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ и т. 5, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, тъй като представената оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на обществената поръчка и на условията за представяне, посочени в документацията - предложение за изпълнение образец №1.

Б/ Проверка на съдържанието на ценовото предложение на допуснатия участник за съответствие с изискванията на Възложителя.

КАПИТОЛ – К ЕООД

Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи, а именно: Ценово предложение – *Образец 2*; Попълнена количествено – стойностна сметка (*Образец 2.1* към ценовото предложение); Анализи на единичните цени за всяка една позиция/ред, посочени в *Образец 2.1*

Съгласно представеното Ценово предложение участникът е посочил следното:

1.1 Обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на договора, включително непредвидените разходи **83 037,09 евро** (осемдесет и три хиляди тридесет и седем евро и девет евроцента) **без ДДС**, формирана както следва:

- Цена на СМР 80 618,53 евро без ДДС (осемдесет хиляди шестстотин и осемнадесет евро и петдесет и три евроцента) съгласно КСС Образец № 2.1,
- Непредвидени разходи 2 418,56 евро (две хиляди четиристотин и осемнадесет евро и петдесет и шест евроцента);

1.2 Ценообразуващите показатели на всички видове работи, включени в Количествено – стойностната сметка (*Образец 2.1* към ценовата оферта), и на допълнителни видове работи, възникнали в процеса на строителство, както следва:

- часова ставка **- 5.00 евро/чч**
- допълнителни разходи върху труда /максимален процент 100 %/ **- 100 %**
- допълнителни разходи върху механизация /макс. процент 30 %/ **- 30 %**

ОБЩИНА ГАБРОВО

- доставно – складови разходи /максимален процент 8 %/ - **8 %**
- печалба /максимален процент 10 % / - **10 %**

Комисията констатира, че представеното Ценово предложение от участник КАПИТОЛ – К ЕООД съответства на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и на изискванията на Възложителя, обективирани в документацията за участие.

Предвид гореизложеното, комисията допуска до оценяване офертата на участника.

Комисията извърши проверка за наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 1 т. 2 от ЗОП на офертата на допуснатия участник.

При извършената проверка, такива не бяха установени.

Комисията прие за установено: Участници, чиито оферти съответстват на чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и на изискванията на Възложителя, обективирани в документацията за участие и са оценени: КАПИТОЛ – К ЕООД.

III. В съответствие с разпоредбите на чл. 61, ал. 2, т. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участника, при което бе установено следното:

КАПИТОЛ – К ЕООД

Участникът е представил Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по зададен от Възложителя образец в платформата ЦАИС - ЕОП, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в документацията на обществената поръчка, подписан от управителя на дружеството.

Комисията направи справка в публично достъпните регистри ТР и ЦПРС, с цел установяване съответствие на декларираните данни.

От информацията, налична в представените документи и служебно извършената справка, Комисията прие за установено, че участник КАПИТОЛ – К ЕООД покрива изискванията за лично състояние и критериите за подбор, отнасящи се до годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност и минимални изисквания за технически и професионални способности, обективирани в документацията и за същия не са налице основания за отстраняване, посочени в ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.

Предвид гореизложеното, офертата на участник КАПИТОЛ – К ЕООД се допуска до класиране.

IV. Съгласно обявения критерий „икономически най-изгодна оферта“, определена въз основа на Критерий за възлагане – „най - ниска цена”, комисията класира:

I-во място - КАПИТОЛ – К ЕООД

ОБЩИНА ГАБРОВО

V. Въз основа на горните констатации, комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на поръчката с КАПИТОЛ – К ЕООД.

Настоящият протокол е изготвен на 27.10.2026 г.

За верността на гореизложеното К[illegible]ията се подписва в състав както следва:

Председател: Емилия Драганешева – .....

Членове:
1. инж. Стилияна Иванова – .....
2. инж. Момчил Корназов – .....
3. инж. Богдан Бонев – .....
4. Цветина Козарева – .....

Заличена информация
на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП

Утвърждавам:

Таня Христова
Кмет на Община Г[illegible]

Дата: 30.10.2026 г.

ОБЩИНА ГАБРОВО КМЕТ
